
Ambientación Servidor de Archivos Servidor Web	435 horalun 20/02/23 vie 05/05/23 4 horas lun 20/02/23 lun 20/02/23
Ambientación Servidor de Archivos	4 horas lun 20/02/23 lun 20/02/23
Servidor de Archivos	4 horas lun 20/02/23 lun 20/02/23
Sanidar Wah	2 horas lun 20/02/23 lun 20/02/23 Desarrollador 1
Servicor vveb	2 horas lun 20/02/23 lun 20/02/23 3 Desarrollador 1
Configuración	4 horas lun 20/02/23 lun 20/02/234
Арр	2 horas lun 20/02/23 lun 20/02/23 Desarrollador 1
Base de datos Interna SqlLIte	2 horas lun 20/02/23 lun 20/02/23 6 Desarrollador 1
Analisis y Diseño	38 horas mar 21/02/2 lun 27/02/237
Contratos Api´s	4 horas mar 21/02/2: mar 21/02/2: Arquitecto
Modelo entidad relación DB Centralizada	2 horas mar 21/02/2: mar 21/02/2: 9 Arquitecto
Modelo entidad relación DB interna Movil	6 horas mar 21/02/25 mié 22/02/25 10 Arquitecto
Entregable Modelo entidad relación DB interna Movil	8 horas mié jue 23/02/23 11 Arquitecto 22/02/23
Documento de Arquitectura Software de APP	16 horas jue 23/02/23 lun 27/02/23 12 Arquitecto
Seguimiento actividades	2 horas lun 27/02/23 lun 27/02/23 13 Project Manager
Desarrollo	389 horalun 27/02/23vie 05/05/23 14
Splash Screen	12 horas lun 27/02/23 mié 01/03/2:
Crear Inerfaz de usuario	6 horas lun 27/02/23 mar 28/02/2: Desarrollador 1
Pruebas unitarias	1 hora mar 28/02/2: mar 28/02/2: 17 Desarrollador 1
Pruebas de aseguramiento Calidad	2 horas mar 28/02/2: mar 28/02/2: 18 Ing Pruebas
Seguimiento actividades	2 horas mar 28/02/2: mié 01/03/2: 19 Project Manager
Presentación de funcionalidad	1 hora mié 01/03/23 mié 01/03/23 20 Desarrollador 1
F F S	Crear Inerfaz de usuario Pruebas unitarias Pruebas de aseguramiento Calidad Geguimiento actividades



ld	Mo de tare	(Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Nombres de los recursos	
22	-5				25 horas	mié 01/03/2	ilun 06/03/23	21	
23	-5	Crear Inerfaz	8 horas	mié 01/03/2	ijue 02/03/23		Desarrollador 1		
24	5	Controlador A	olador Api versión			jue 02/03/23	3 jue 02/03/23	23	Desarrollador 1
25	-5	Persitencia DE	Persitencia DB Interna versión				3 jue 02/03/23	24	Desarrollador 1
26	-5	Consulta DB I	nterna versión		1 hora	vie 03/03/23	3 vie 03/03/23	25	Desarrollador 1
27	-	Consulta DB	Interna última actualiz	ación	1 hora	vie 03/03/23	3 vie 03/03/23	26	Desarrollador 1
28	-5	Consulta DB	Interna último envío		1 hora	vie 03/03/23	3 vie 03/03/23	27	Desarrollador 1
29	-	Pruebas unita	rias		2 horas	vie 03/03/23	3 vie 03/03/23	28	Desarrollador 1
30	-5	Pruebas de las	seguramiento Calidad		3 horas	vie 03/03/23	3 vie 03/03/23	29	Ing Pruebas
31	-5	Seguimiento a	actividades		2 horas	lun 06/03/23	3 lun 06/03/23	30	Project Manager
32	-	Presentación	1 hora	lun 06/03/23	3 lun 06/03/23	31	Desarrollador 1		
33	-9	Guias	46 horas	lun 06/03/2	3mar 14/03/2	32			
34	-9	Crear Inerfaz	16 horas	lun 06/03/23	3 mié 08/03/23		Desarrollador 1		
35	-5	Controlador A	Api Opciones de guias		6 horas	mié 08/03/2	ijue 09/03/23	34	Desarrollador 1
36	-5	Persitencia DE	3 Interna Opciones de ខ្	guias	4 horas	jue 09/03/23	3 jue 09/03/23	35	Desarrollador 1
37	-9	Comparación	HASH		12 horas	jue 09/03/23	3 lun 13/03/23	36	Desarrollador 1
38	-5	Pruebas unita	rias		2 horas	lun 13/03/23	3 lun 13/03/23	37	Desarrollador 1
39	-5	Pruebas de las	seguramiento Calidad		3 horas	lun 13/03/23	3 lun 13/03/23	38	Ing Pruebas
40	-5	Seguimiento a	actividades		2 horas	lun 13/03/23	3 lun 13/03/23	39	Project Manager
41	-9	Presentación	de funcionalidad		1 hora	mar 14/03/2	mar 14/03/2	40	Desarrollador 1
42	-9	Guia -> "Aplicac	ión de riego"		31 horas	mar 14/03/2	2 vie 17/03/23	41	
43	-9	Crear Inerfaz	de usuario		8 horas	mar 14/03/2	2:mié 15/03/23		Desarrollador 1
44	-5	Consultar DB	Interna Opciones de gu	ias	1 hora	mié 15/03/2	3mié 15/03/23	43	Desarrollador 1
			Tarea		Resumen inactivo			Tareas exter	nas
			División		Tarea manual			Hito externo	\Qquad
			Hito	♦	solo duración			Fecha límite	+
	Proyecto: PlanTrabajo Fecha: mar 21/02/23 Resumen			Informe de resum	nen manual 🚃		Progreso		
i ecile			Resumen del proyecto		Resumen manual			Progreso ma	anual
			Tarea inactiva		solo el comienzo	Е		-	
			Hito inactivo	\Diamond	solo fin				

Id	MocNode de tare	ombre de tarea			Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Nombres de los recursos
45	-5	Visualizar Html				mié 15/03/2	mié 15/03/23	44	Desarrollador 1
46	-5	Pruebas unita	Pruebas unitarias				jue 16/03/23	45	Desarrollador 1
47	-5	Pruebas de las	bas de aseguramiento Calidad			jue 16/03/23	vie 17/03/23	46	Ing Pruebas
48	-	Seguimiento a	niento actividades			vie 17/03/23	vie 17/03/23	47	Project Manager
49	-5	Presentación (de funcionalidad		1 hora	vie 17/03/23	vie 17/03/23	48	Desarrollador 1
50	-5	Autentificación	Usuario		29 horas	lun 20/03/23	ijue 23/03/23	49	
51	-	Crear Inerfaz	de usuario		12 horas	lun 20/03/23	mar 21/03/2		Desarrollador 1
52	-	Controlador A	Api autentificación de us	suario	5 horas	mar 21/03/2	mié 22/03/23	51	Desarrollador 1
53	-	Persitencia DE	B Interna autentificaciór	າ de usuario	4 horas	mié 22/03/2	mié 22/03/23	52	Desarrollador 1
54	-	Pruebas unita	rias		3 horas	mié 22/03/23	mié 22/03/23	53	Desarrollador 1
55	-	Pruebas de as	seguramiento Calidad		3 horas	jue 23/03/23	jue 23/03/23	54	Ing Pruebas
56	-	Seguimiento actividades			1 hora	jue 23/03/23	jue 23/03/23	55	Project Manager
57	-5	Presentación de funcionalidad				jue 23/03/23	jue 23/03/23	56	Desarrollador 1
58	-5	Importar núme	ros de serie		40 horas	jue 23/03/23	iue 30/03/23	57	
59	-5	Crear Inerfaz	de usuario		20 horas	jue 23/03/23	mar 28/03/2		Desarrollador 1
60	-	Controlador A	Api a números de serie		5 horas	mar 28/03/2	mar 28/03/2	59	Desarrollador 1
61	-5	Persitencia DE	B Interna números de s	serie	6 horas	mar 28/03/2	mié 29/03/23	60	Desarrollador 1
62	-5	Pruebas unita	rias		4 horas	mié 29/03/23	mié 29/03/23	61	Desarrollador 1
63	-5	Pruebas de as	seguramiento Calidad		3 horas	jue 30/03/23	jue 30/03/23	62	Ing Pruebas
64	-5	Seguimiento a	actividades		1 hora	jue 30/03/23	jue 30/03/23	63	Project Manager
65	-5	Presentación (de funcionalidad		1 hora	jue 30/03/23	jue 30/03/23	64	Desarrollador 1
66	-5	Supervisión			266 hora	lun 06/03/23	ijue 20/04/23	32	
67	-5	Crear Inerfaz	de usuario		16 horas	lun 06/03/23	mié 08/03/23		Desarrollador 2
			Tarea		Resumen inactivo	,		Tareas exter	nac
			División		Tarea manual	,		Hito externo	
			Hito	•	solo duración	_		Fecha límite	_
1		anTrabajo							<u> </u>
Fecha	ı: mar 2	21/02/23	Resumen del provecto		Informe de resum			Progreso ma	
			Resumen del proyecto	U	Resumen manual	I	ı.	Progreso ma	anual
			Tarea inactiva		solo el comienzo	L			
			Hito inactivo		solo fin	3			

ld	Mod de tare	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Nombres de los recursos		
68	-5	Consulta DB	2 horas	mié 08/03/2	23 mié 08/03/23	67	Desarrollador 2		
69	-5	Pruebas unita	4 horas	mié 08/03/2	23 jue 09/03/23	68	Desarrollador 2		
70	-5	Pruebas de las	Pruebas de aseguramiento Calidad				3 jue 09/03/23	69	Ing Pruebas
71	-5	Seguimiento a	actividades	1 hora	jue 09/03/2	3 jue 09/03/23	70	Project Manager	
72	-5	Presentación (Presentación de funcionalidad				3 jue 09/03/23	71	Desarrollador 2
73	-5	Supervisión -	Datos Generales		23 horas	jue 09/03/2	3mar 14/03/2	72	
74	-5	Crear Iner	faz de usuario		12 horas	jue 09/03/2	3 lun 13/03/23		Desarrollador 2
75	-5	Consulta D	B Interna números de	serie	2 horas	lun 13/03/2	3 lun 13/03/23	74	Desarrollador 2
76	-5	Pruebas uni	itarias		4 horas	lun 13/03/2	3 lun 13/03/23	75	Desarrollador 2
77	-5	Pruebas de	aseguramiento Calidad	ł	3 horas	mar 14/03/	2:mar 14/03/2	76	Ing Pruebas
78	-5	Seguimiento actividades			1 hora	mar 14/03/	2:mar 14/03/2	77	Project Manager
79	-5	Presentació	1 hora	mar 14/03/	2:mar 14/03/2	78	Desarrollador 2		
80	5	Supervisión -	55 horas	mar 14/03/	2 jue 23/03/23	79			
81	-5	Crear Iner	faz de usuario		40 horas	mar 14/03/	2:mar 21/03/2		Desarrollador 2
82	-5	Consulta D	B Interna números de	serie	2 horas	mar 21/03/	2:mar 21/03/2	81	Desarrollador 2
83	-5	Pruebas uni	itarias		8 horas	mar 21/03/	2:mié 22/03/23	82	Desarrollador 2
84	4	Pruebas de	aseguramiento Calidad	l	3 horas	mié 22/03/2	23jue 23/03/23	83	Ing Pruebas
85	-5	Seguimient	o actividades		1 hora	jue 23/03/2	3 jue 23/03/23	84	Project Manager
86	-5	Presentació	on de funcionalidad		1 hora	jue 23/03/2	3 jue 23/03/23	85	Desarrollador 2
87	-5	Supervisión -	Evidencia Fotografica		34 horas	jue 23/03/2	3mié 29/03/2	86	
88	-5	Crear Iner	faz de usuario		14 horas	jue 23/03/2	3 lun 27/03/23		Desarrollador 2
89	-5	Tomar foto	ografía de evidencia		5 horas	lun 27/03/2	3 lun 27/03/23	88	Desarrollador 2
90	4	Consulta D	B Interna números de	serie	2 horas	lun 27/03/2	3 mar 28/03/23	89	Desarrollador 2
			Tarea		Resumen inactivo			Tareas exter	nas
	Hito •				Tarea manual			Hito externo	\rightarrow
				♦	solo duración			Fecha límite	.
1	Proyecto: PlanTrabajo		Resumen		Informe de resum	nen manual 📥		Progreso	
recna	ı. mar	21/02/23	Resumen del proyecto		Resumen manual			Progreso ma	anual
			Tarea inactiva		solo el comienzo	Ē		J	
			Hito inactivo	\Diamond	solo fin	_			
			The macrie	·	30.0 1111				

t		lombre de tarea			Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Nombres de los recursos
	de tare								
91		Pruebas ur	nitarias		8 horas	mar 28/03/2	::mié 29/03/	2390	Desarrollador 2
92	-	Pruebas de	e aseguramiento Ca	lidad	3 horas	mié 29/03/2	3mié 29/03/2	2391	Ing Pruebas
93		Seguimien	to actividades		1 hora	mié 29/03/2	3mié 29/03/2	2392	Project Manager
94	-5	Presentaci	ón de funcionalidad		1 hora	mié 29/03/2	3mié 29/03/2	2393	Desarrollador 2
95	-	Supervisión -	Identificaciones		64 horas	mié 29/03/2	ilun 10/04/2	2394	
96	-	Crear Iner	faz de usuario		36 horas	mié 29/03/2	3mié 05/04/2	23	Desarrollador 2
97	-	Tomar fot	ografía de identifica	ación	5 horas	mié 05/04/2	3mié 05/04/2	2396	Desarrollador 2
98	-	Generar fir	·ma		8 horas?	mié 05/04/2	3jue 06/04/2	3 97	Desarrollador 2
99	-	Consulta D	DB Interna número	s de serie	2 horas	jue 06/04/23	3 vie 07/04/2	3 98	Desarrollador 2
100	-	Pruebas ur	nitarias		8 horas	vie 07/04/23	Iun 10/04/2	3 99	Desarrollador 2
101	-	Pruebas de	aseguramiento Ca	lidad	3 horas	lun 10/04/23	3 lun 10/04/2	3 100	Ing Pruebas
102	-	Seguimient	to actividades		1 hora	lun 10/04/23	3 lun 10/04/2	3 101	Project Manager
103	-	Presentaci	ón de funcionalidad	1	1 hora	lun 10/04/23	3 lun 10/04/2	3 102	Desarrollador 1
104	-5	Supervisión -	Finalización		63 horas	lun 10/04/2	3 jue 20/04/2	23 103	
105	-5	Crear Iner	rfaz de usuario		36 horas	lun 10/04/23	3 lun 17/04/2	.3	Desarrollador 2
106	-	Consulta D	DB Interna número	s de serie	2 horas	lun 17/04/23	3 lun 17/04/2	13 105	Desarrollador 2
107	-	Generar Z	ip		8 horas	lun 17/04/23	3 mar 18/04/	2:106	Desarrollador 2
108	-5	Actualizar	DB Interna de envío	o (finalizada)	4 horas	mar 18/04/2	::mar 18/04/	2:107	Desarrollador 2
109	-5	Pruebas ur	nitarias		8 horas	mié 19/04/2	3mié 19/04/2	23108	Desarrollador 2
110	-5	Pruebas de	e aseguramiento Ca	lidad	3 horas	jue 20/04/23	3 jue 20/04/2	3 109	Ing Pruebas
111	-5	Seguimien	to actividades		1 hora	jue 20/04/23	3 jue 20/04/2	3 110	Project Manager
112	-	Presentaci	ón de funcionalidad	I	1 hora	jue 20/04/23	3 jue 20/04/2	3 111	Desarrollador 2
113	-5	Envio de verific	aciones		47 horas	jue 20/04/2	3vie 28/04/2	23 112	
			Tarea		Resumen inactivo			Tareas exter	rnas
			División		Tarea manual			Hito externo	>
_	. =		Hito	♦	solo duración			Fecha límite	•
•		lanTrabajo 21/02/23	Resumen		Informe de resum	nen manual 📥		Progreso	

solo fin

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo


Resumen manual


solo el comienzo


Е


Progreso manual


d	MocNo	mbre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Nombres de los recursos
	de						
114	tare	Crear Inerfaz de usuario	20 horas	jue 20/04/23	mar 25/04/23		Desarrollador 2
115	-	Consulta DB Interna verificaciones finalizadas		mar 25/04/2			Desarrollador 2
116	-5	Guardar Zip en servidor	8 horas	mar 25/04/2	mié 26/04/23	115	Desarrollador 2
117		Persitencia DB Interna de envío (estatus enviado)	4 horas	mié 26/04/23	mié 26/04/23	116	Desarrollador 2
118	-	Pruebas unitarias	8 horas	mié 26/04/23	jue 27/04/23	117	Desarrollador 2
119	-	Pruebas de aseguramiento Calidad	3 horas	jue 27/04/23	vie 28/04/23	118	Desarrollador 2
120	-9	Seguimiento actividades	1 hora	vie 28/04/23	vie 28/04/23	119	Desarrollador 2
121	-5	Presentación de funcionalidad	1 hora	vie 28/04/23	vie 28/04/23	120	Desarrollador 2
122	-9	Historial de Envíos	39 horas	vie 28/04/23	vie 05/05/23	121	
123	-9	Crear Inerfaz de usuario	16 horas	vie 28/04/23	mar 02/05/23		Desarrollador 2
124	-5	Consulta DB Interna verificaciones finalizadas	2 horas	mar 02/05/2	mar 02/05/23	123	Desarrollador 2
125		Eliminar Zip en localmente	4 horas	mar 02/05/2	mié 03/05/23	124	Desarrollador 2
126	-	Persitencia DB Interna de envío (estatus eliminado)	4 horas	mié 03/05/23	mié 03/05/23	125	Desarrollador 2
127	-	Pruebas unitarias	8 horas	mié 03/05/23	jue 04/05/23	126	Desarrollador 2
128		Pruebas de aseguramiento Calidad	3 horas	jue 04/05/23	vie 05/05/23	127	Ing Pruebas
129	-	Seguimiento actividades	1 hora	vie 05/05/23	vie 05/05/23	128	Project Manager
130	-	Presentación de funcionalidad	1 hora	vie 05/05/23	vie 05/05/23	129	Desarrollador 2




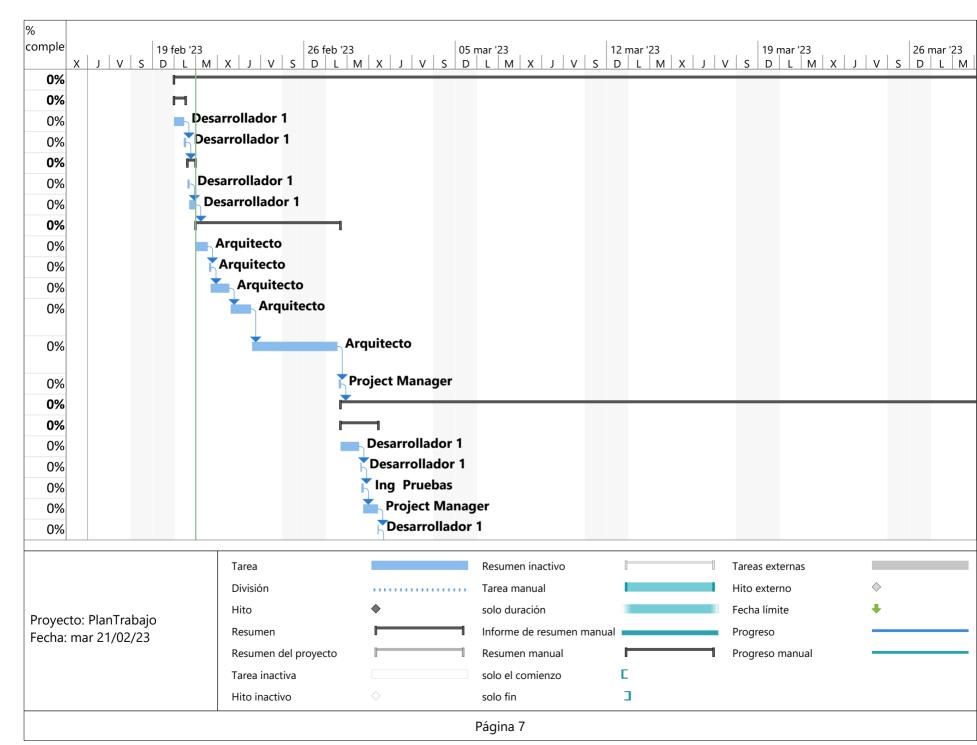


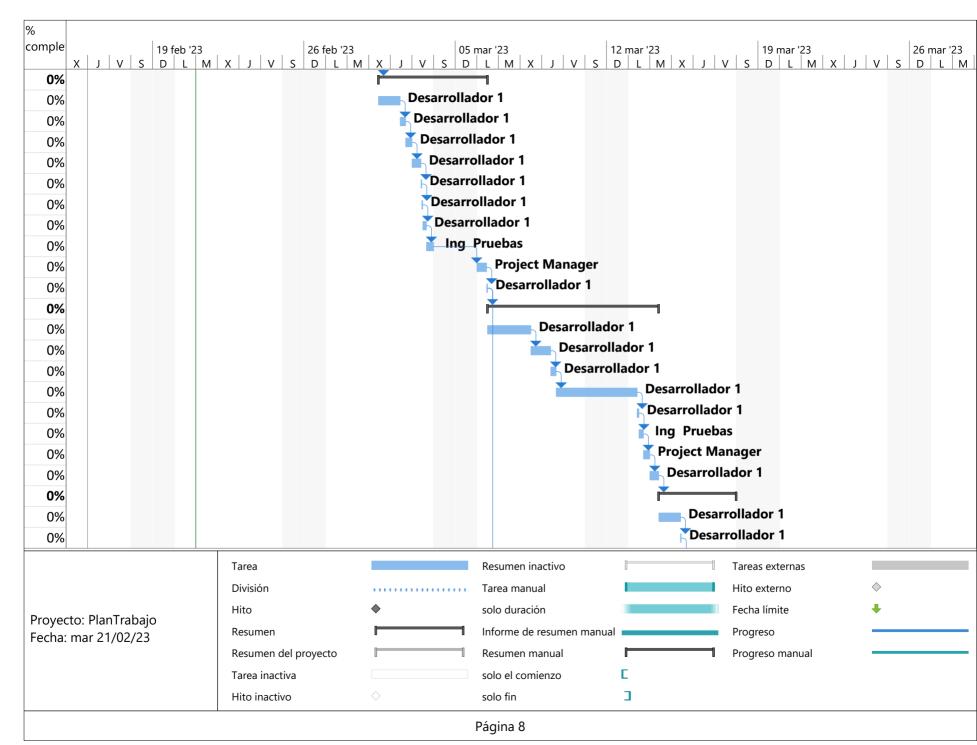

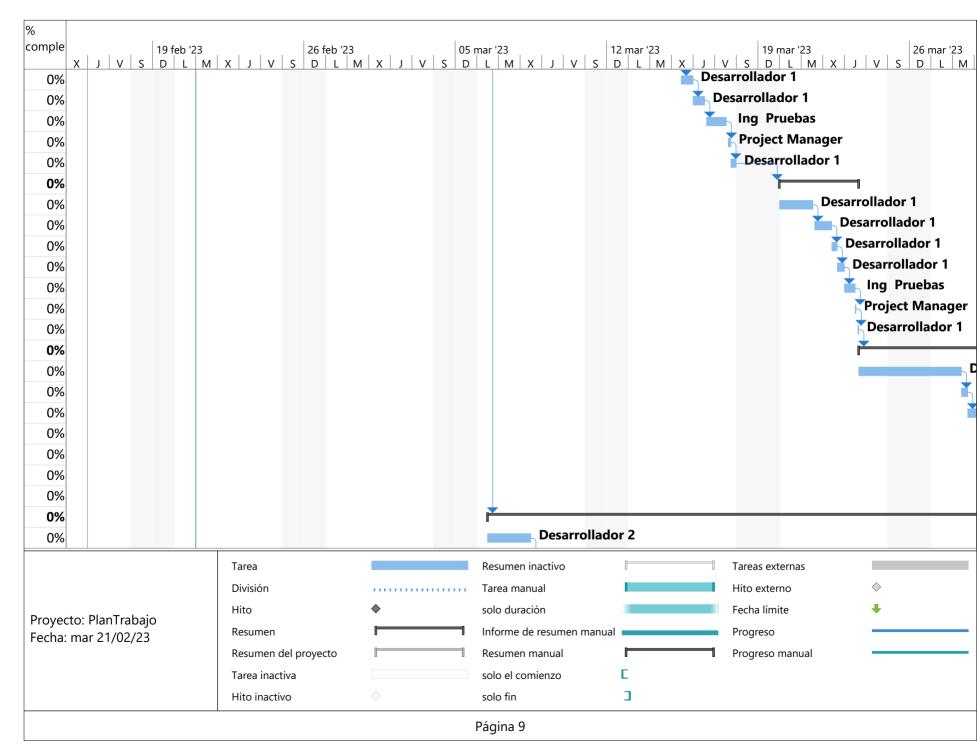

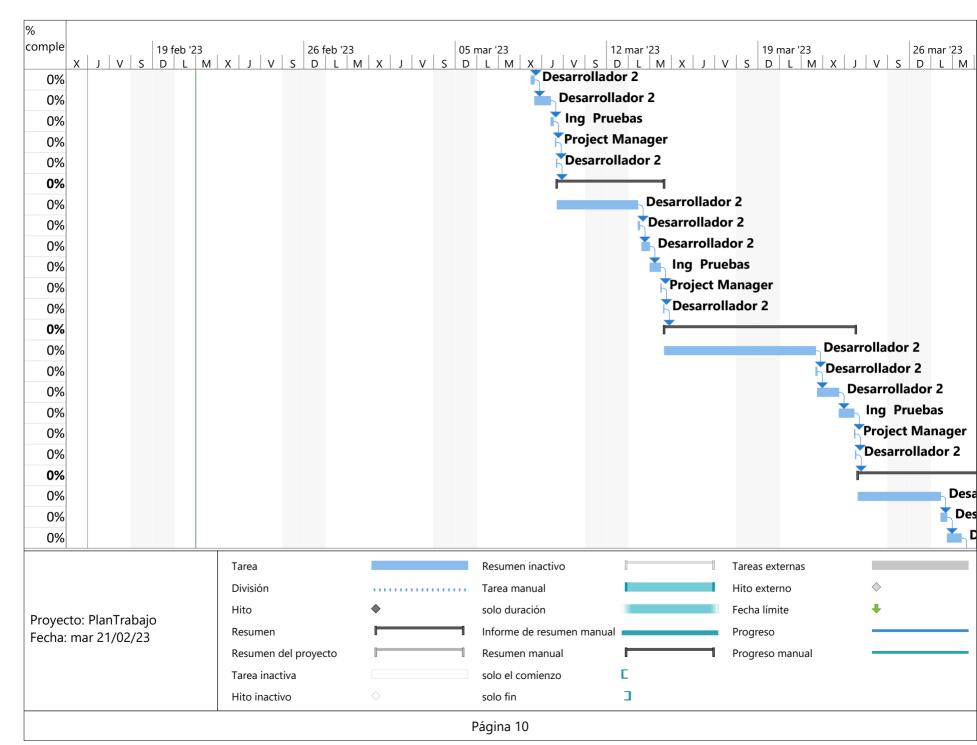

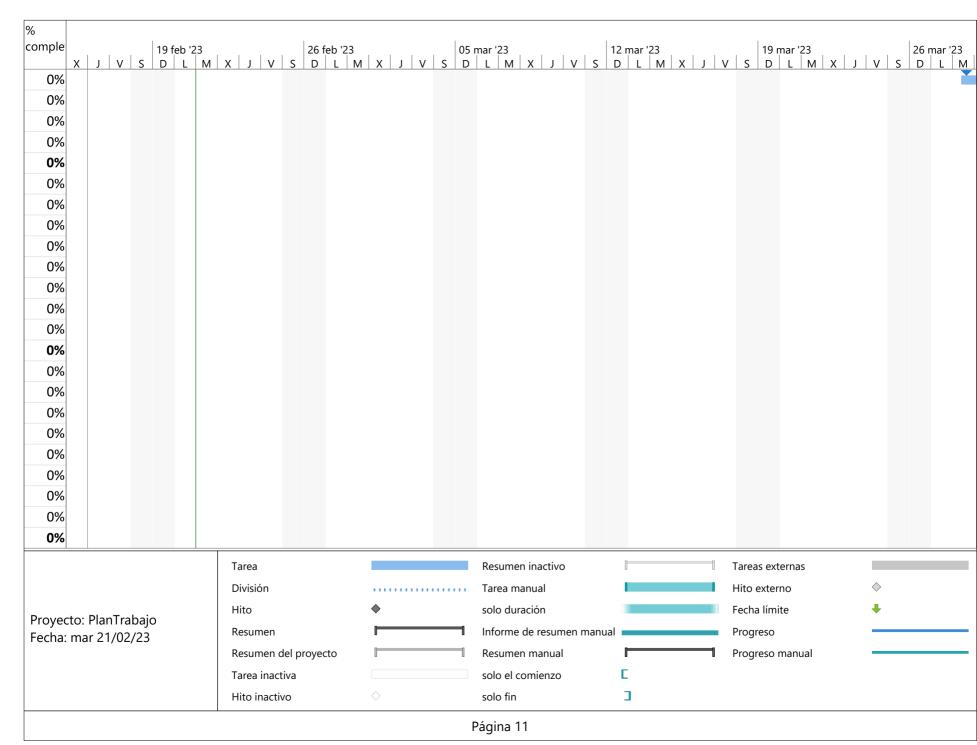

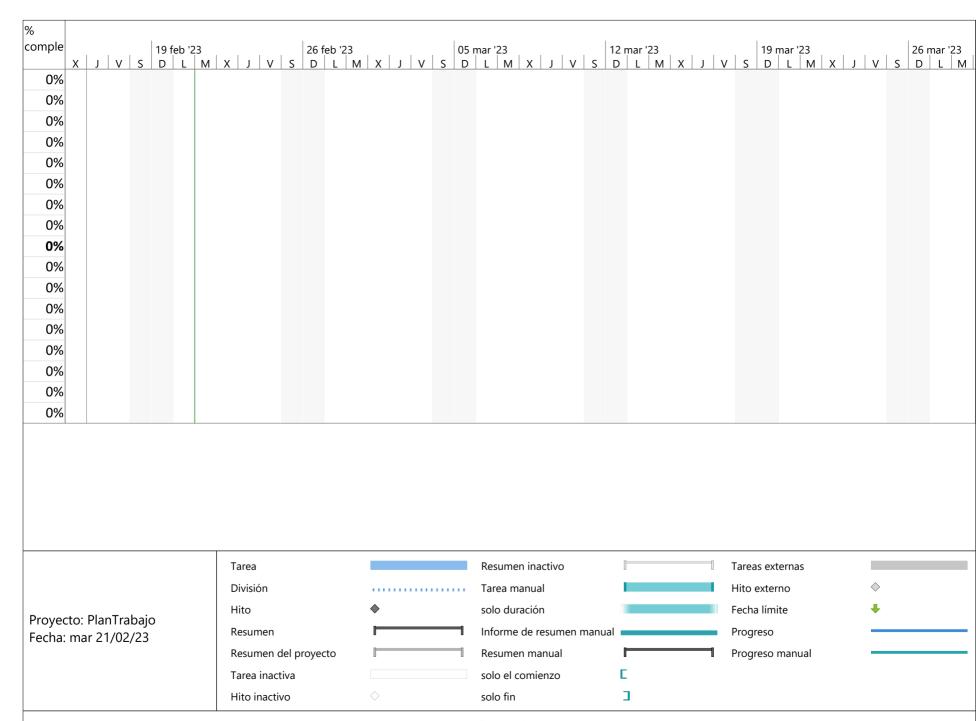

Página 12

